

AGRÍCOLA SOLER CORTINA S.A.

**PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA, FRENTE A LA EVENTUALIDAD
DE UN FOCO DE INCENDIO FORESTAL O DE VEGETACIÓN
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO “MEJORAMIENTO
Y ACTUALIZACIÓN INSTALACIONES AGROPECUARIAS
LOS CASTAÑOS”**

Curicó, agosto 2022

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	Introducción.....	3
2	Objetivo	3
3	RESPONSABILIDADES	3
4	plan de prevención y contingencias.....	4
4.1	Medidas de prevención y contingencias.....	4
4.1.1	limpieza del Terreno	4
4.1.2	corta fuego y mantención	5
4.1.3	Capacitaciones y Educación.....	6
4.1.4	Difusión.....	6
4.1.5	Definición de zonas de trabajo	7
4.2	Sistema de extinción de incendios	7
5	PLAN DE EMERGENCIAS	9

1 INTRODUCCIÓN

Agrícola Soler Cortina S.A. es una empresa familiar fundada en el año 1974, dedicada a la producción y comercialización de carnes y cecinas de cerdo. Las principales instalaciones de la empresa se ubican en la Región del Maule. Una de estas instalaciones corresponde al plantel productor Los Castaños, el cual opera en la comuna de Curicó hace varias décadas. El proyecto tiene como objetivo actualizar y mejorar el plantel Los Castaños a través de la normalización de instalaciones existentes e incorporación y modificación de otras.

El proyecto tiene como objetivo actualizar y mejorar el plantel Los Castaños a través de la normalización de instalaciones existentes e incorporación y modificación de otras.

2 OBJETIVO

El objetivo es contar con un plan de control y prevención de incendios para evitar y/o minimizar la ocurrencia de ellos, y definir la forma de abatimiento en caso de ocurrencia, para de esta forma asegurar la integridad física de los trabajadores y la protección de los recursos naturales ante la ocurrencia de un incendio forestal o de vegetación.

3 RESPONSABILIDADES

Portería

- Se encargará de dar aviso de una emergencia a Bomberos y/o CONAF.

Prevención de riesgos

- Evaluará la magnitud del siniestro mientras llega personal de Bomberos y/o CONAF.
- Coordinará actividades con la Brigada de Emergencias con la finalidad de evacuar y resguardar a los trabajadores.

Brigada de emergencia

- Prestará apoyo en la evacuación de los trabajadores que estén expuestos a la emergencia.
- Apoyará al personal de Bomberos y CONAF en identificar el lugar del incendio y características generales del lugar.

Jefe de Proyecto:

- Responsable de la generación y mantención de los cortafuegos y la señalética existe.

4 PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIAS

De acuerdo al área, tipo de plantaciones existentes en la zona y sus alrededores, sequías prolongadas, aumento de las temperaturas y sumándose además la acción humana, genera factores que pueden iniciar un incendio. Debido a lo anterior, se ha diseñado un plan que cuenta con medidas de prevención y contingencias, que se detallan a continuación:

4.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIAS

La prevención está referida a las actividades tendientes a evitar que se inicien incendios forestales y/o de vegetación. A continuación, se presentan las medidas a implementar para prevenir las posibles situaciones de riesgo o contingencia.


4.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO

Tanto en fase de construcción como de operación, se realizará una limpieza del terreno para eliminar el pasto seco y basura del terreno que podría generar un foco de incendio.

- En fase de construcción, la limpieza se realizará antes de comenzar las obras, liberando primero el área de la instalación de faenas y luego el resto del área a intervenir
- En fase de operación, se realizará una limpieza al iniciar la primavera, manteniendo una faja de seguridad en los límites del predio y los cultivos se mantendrán con el mayor contenido de humedad posible,

Respecto de los residuos de limpieza, serán manejados cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente. Su almacenamiento temporal será en sitios autorizados por la Seremi de Salud del Maule, para ello se solicitó en la DIA los PAS 140 y 142, asociados al almacenamiento temporal de residuos no peligrosos y peligrosos respectivamente. Su transporte y disposición final será en sitios debidamente autorizados por la Seremi de Salud. En la siguiente figura se muestra la ubicación de los sectores de almacenamiento de residuos.

Figura N° 1 Sectores de almacenamiento de residuos

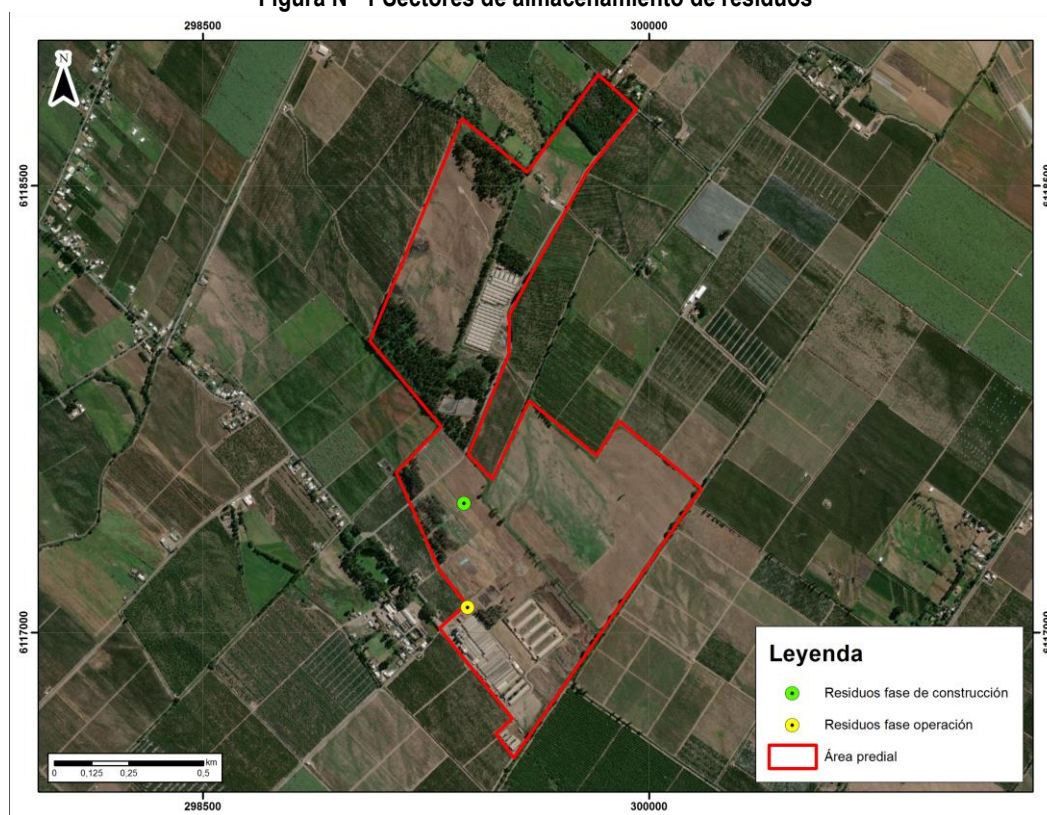

Fuente. Elaboración propia

4.1.2 CORTA FUEGO Y MANTENCIÓN

En los terrenos colindantes al proyecto donde exista vegetación se realizarán corta fuegos de acuerdo a lo siguiente:

- Serán franjas de 5 m de ancho aprox., donde se eliminará la capa vegetal.
- Se realizará mantención de forma mensual con el fin de evitar el crecimiento de vegetación.

Una vez eliminada la capa vegetal, se procederá a realizar el corta fuego mediante el uso de maquinaria.



Se adjunta plano de la ubicación de los cortafuegos a este documento.

4.1.3 CAPACITACIONES Y EDUCACIÓN

Su propósito esencial es crear conciencia sobre el valor que representan los recursos naturales renovables y la necesidad de preservarlos. A través de estas actividades se pretende sensibilizar al personal del proyecto, de modo de provocar cambios en su comportamiento respecto a la responsabilidad que les cabe en la iniciación y programación de un incendio forestal.

Estas acciones pretenden capacitar a los trabajadores en acciones de prevención de incendios forestales y en los posibles daños que pueden causar estos siniestros tanto en la parte ecológica, económica y social.

Los temas a considerar en las capacitaciones son los siguientes:

- Orden y aseo de los puestos de trabajo
- Prohibición de fumar y/o hacer fuego
- Manejo de la basura
- Nociones teóricas básicas con respecto al comportamiento del fuego y los métodos de combate de incendios
- Técnicas para el control de incendios (uso de extintores)

El encargado de las capacitaciones será el profesional Prevencionista de Riesgos, quien llevará un registro firmado por los trabajadores, el cual estará disponible en la obra (en la fase de construcción) y en el departamento de Prevención de riesgos (fase de operación) en caso de fiscalizaciones.

4.1.4 DIFUSIÓN

En los lugares de trabajo se instalarán letreros con información para prevenir incendios forestales y de vegetación. Se considera la instalación de 3 letreros, estos son:



Los textos indicaran “PROHIBIDO QUEMAR BASURA” “PROHIBIDO HACER FUEGO” “NO FUMAR”; la cantidad será 1 de cada tipo, ubicados en un lugar visible a la entrada de la instalación de faenas (fase de construcción) y en la entrada del plantel (fase de operación).

4.1.5 DEFINICIÓN DE ZONAS DE TRABAJO

Todas las actividades eléctricas, de corte de fierro, soldaduras o similares se realizarán en la instalación de faenas, la cual estará debidamente delimitada.

En la instalación de faena, se definirán zonas de trabajo para disminuir potenciales causas de incendios de vegetación, por ejemplo: chispas de corte de fierro, soldaduras o similares. En estas zonas se implementarán las siguientes medidas preventivas:

- Se mantendrá delimitado, limpio y ordenado el área de trabajo
- Se capacitará a los trabajadores respecto a incendios, uso de extintores, trabajo seguro y uso de EPP.
- Se revisará periódicamente el estado de los extintores, en toda la obra
- Se revisará el uso de los elementos de seguridad personal de los trabajadores
- Se revisará las maquinarias que se utilicen, para detectar alguna fuga o daño de material
- El manejo de la maquinaria solo será realizado por personal capacitado para la actividad
- Se evitará en todo momento la ejecución de procesos de soldaduras en la cercanía de materiales inflamables.

4.2 SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS


Durante la fase de construcción y operación se considera mantener los siguientes elementos:

- Equipos extintores
- Azadón
- Rastrillo
- Pala
- Celular o radio de comunicación

Lo anterior enfocado en el control de pequeños incendios, cuyo control no coloque en riesgo al personal. De tratarse de un evento de mayor magnitud se avisará inmediatamente a bomberos al teléfono de emergencia 132 y CONAF al 130, o en su defecto el 71-2226800.

En el caso de presentarse un incendio forestal o de vegetación, estará disponible para ser utilizado por bomberos y CONAF, tranques de acumulación de agua de canal existente en el predio. Por otra parte, al interior del predio existen cursos de agua superficial, que de igual modo pueden ser utilizados como fuente agua. En la siguiente figura se muestra la ubicación de los tranques mencionado y los cursos de agua existentes.

Figura N° 2 ubicación acumulación de agua

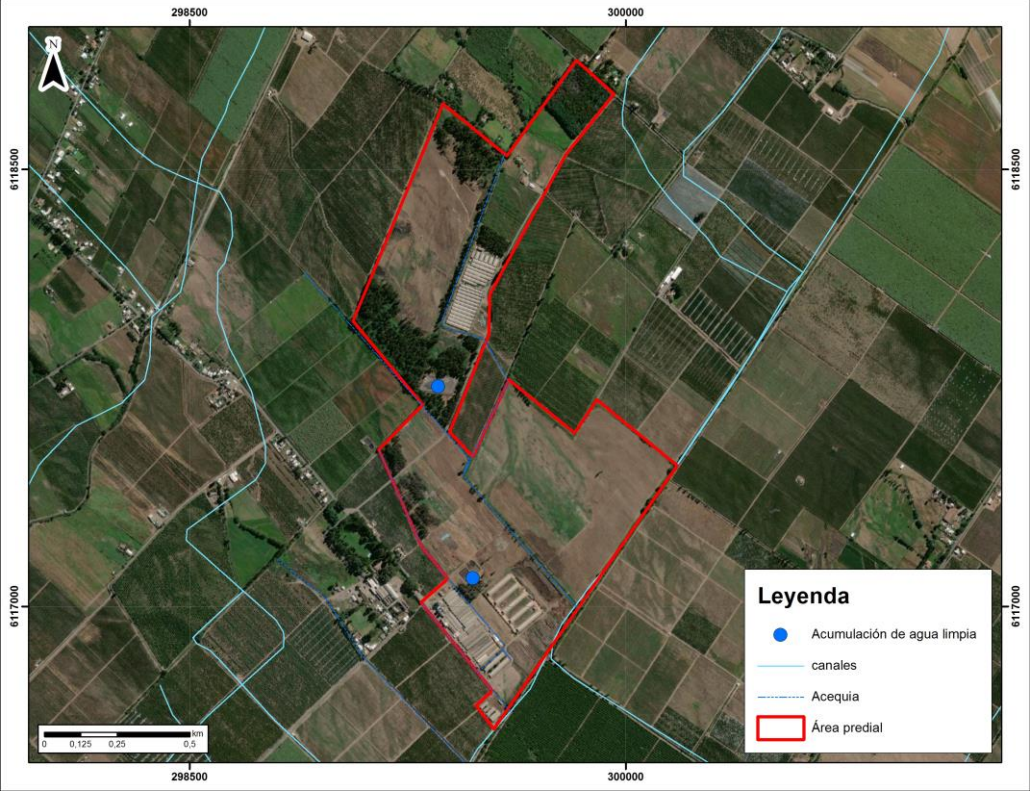

Fuente. Elaboración propia

5 PLAN DE EMERGENCIAS

Ante la percepción directa (visualización) o indirecta (calor, humo) de fuego o sus signos, el personal de trabajo debe seguir ordenada y estrictamente las indicaciones en el orden que se detalla:

- Informar de manera inmediata a su jefe la detección del siniestro, el cual detendrá en el instante las actividades que se estuviesen desarrollando e informará a todo el personal la situación de emergencia, para que se alejen del lugar hacia las zonas de seguridad.
- Luego el jefe a cargo del plantel iniciará la etapa de reconocimiento para obtener la mayor cantidad de información posible de las características del incendio, de manera inmediata, tales como:
 - Tamaño del foco de incendio (en absoluta conciencia y conocimiento), si es pequeño se puede atacar con los elementos de la obra. Si es grande se debe llamar inmediatamente a bomberos al teléfono de emergencia 132 y/o CONAF al número 130, o en su defecto el 71-2226800.
 - Recolectar los antecedentes del lugar afectado por el incendio, para informar a bomberos:
 - Ubicación del foco
 - Revisar si hay elementos combustibles cerca
 - Presencia de focos secundarios
 - Dirección e intensidad del viento
 - Dirección del frente de avance
 - Disponibilidad de agua
 - Valores amenazados. Revisar si hay equipamiento y materiales asociados que se puedan retirar, tales como elementos de trabajo del personal que sean fáciles de movilizar, por ejemplo, subir herramientas a camiones para retirarlos del lugar.

Lo anterior en caso de tratarse de pequeños focos y sin poner en riesgo a los trabajadores. En caso de grandes incendios los trabajadores deberán retirarse del lugar, evacuando lo antes posible.

- En el caso de evaluarse que el incendio supera las capacidades o condiciones del personal, las acciones realizadas previas a la llegada de los Brigadistas de bomberos y/o CONAF serán tendientes a disminuir o limitar la velocidad de avance del fuego.
- Una vez terminado el evento, se debe vigilar el área para evitar un rebrote, además en caso de ser responsabilidad del proyecto se realizará una investigación para conocer las causas y así evitar una futura ocurrencia del mismo evento

En la siguiente figura se entrega el diagrama de flujo de llamadas internas y externas a los servicios de emergencias.

Figura N° 3 Diagrama de flujo llamadas internas y externas

